

ГРАНД-Смета 2021.1

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "СтройПодряд"

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Капитальный ремонт общего имущества (крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, дер. Суетово, ул. Магистральная, д. 10

(наименование, адрес)

Объект	Капитальный ремонт крыши
--------	--------------------------

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.08.2021	07.05.2021	27.08.2021

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с примыканиями	100 м2	9,6029								
		1 ОТ						112,16		1 077,06	20,83	22 435	
		2 ЭМ						41,43		397,85	7,59	3 020	
		ЗТ											
				чел.-ч	14,38		138,089702						
		Итого по расценке						153,59		1 474,91		22 435	
		ФОТ								1 077,06		23 108	
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103		103			1 109,37			
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1		%	59		59			635,47		13 237	
Всего по позиции										3 219,75			61 800
2	2	ФЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 50 мм)	100 м2	8,5981								
		Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1						209,95	0,8	1 444,14	20,83	30 081	
		1 ОТ						189,93	0,8	1 306,43	7,59	9 916	
		2 ЭМ						21,86	0,8	150,36	20,83	3 132	
		З в т.ч. ОТм						36,67	0	0,00	6,17		
		4 М											
		ЗТ		чел.-ч	24,3	0,8	167,147064						
		ЗТм		чел.-ч	1,94	0,8	13,3442512						
		Итого по расценке						436,55		2 750,57		33 213	
		ФОТ								1 594,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 564,20		32 582
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			772,54		16 092
3	3	ФЕР12-01-017-02 Прим. Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ПЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Приказ от 04.08.2019 № 519/пр табл.2 п.1	100 м2				8,5981			5 087,31		88 671
		1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТм		чел.-ч чел.-ч	1 0,03	28 28	240,7468 7,222404	8,64 2,66 0,34	28 28 28	2 080,05 640,39 81,85	20,83 7,59 20,83	43 327 4 861 1 705
		Итого по расценке ФОТ					11,30			2 720,44 2 161,90 2 120,82		45 032 44 176
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 047,44		21 818
4	4	ФЕР46-04-001-04 Прим. Разборка кирпичных стен вент шахт	м3				6,65			5 888,70		114 182
		1 ОТ 2 ЗМ ЗТ		чел.-ч	7,1		47,215	62,91 59,65		418,35 396,67	20,83 7,59	8 714 3 011
		Итого по расценке ФОТ					122,56			815,02 418,35		8 714

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министрострой: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			430,90		8 975
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министрострой: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			246,83		5 141
5	5	ФЕР20-02-012- Разборка дефлекторов диаметром 03 патрубка: 500 мм прим 450	шт		3					1 492,75		25 841
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4										
		1 ОТ						37,96	0,7	79,72	20,83	1 681
		2 ЭМ						5,27	0,7	11,07	7,59	84
		3 в т.ч. ОТм						0,26	0,7	0,55	20,83	11
		4 М						7,63	0	0,00	6,17	
		3Т		чел.-ч	4,45	0,7	9,345					
		3Тм		чел.-ч	0,02	0,7	0,042					
		Итого по расценке						50,86		90,79		
		ФОТ								80,27		1 672
		Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министрострой (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16		%	121	0,9	108,9			87,41		1 821
		Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Министрострой (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16		%	72	0,85	61,2			49,13		1 023
6	6	ФЕР07-05-030- Демонтаж мелких конструкций плит 11 парапетов и вентшахт массой до 0,5 т МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 3ПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 шт		2,03					227,33		4 589
		1 ОТ						934,21	0,8	1 517,16	20,83	31 602
		2 ЭМ						272,16	0,8	441,99	7,59	3 355
		3 в т.ч. ОТм						42,53	0,8	69,07	20,83	1 439
		4 М						1 715,34	0	0,00	6,17	
		3Т		чел.-ч	103	0,8	167,272					
		3Тм		чел.-ч	3,15	0,8	5,1156					
		Итого по расценке						2 921,71		1 959,15		
		ФОТ								1 586,23		33 041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Бетонные и железобетонные сборные Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7		%	110	0,9	99			1 570,37		32 711
		Приказ СП Бетонные и железобетонные сборные Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7		%	73	0,85	62,05			984,26		20 502
7	7	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (фартуки)	100 м			2,464			4 513,78		88 170
		1 ОТ						70,98		174,89	20,83	3 643
		2 ЭМ						0,20		0,49	7,59	4
		3Т		чел.-ч	9,1		22,4224					
		Итого по расценке						71,18		175,38		
		ФОТ								174,89		3 643
		Приказ НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92		%	90		90			157,40		3 279
		Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92		%	46		46			80,45		1 676
8	8	ФЕР46-04-012-03	Всего по позиции	100 м2			0,0049			413,23		8 602
		1 ОТ						737,40		3,61	20,83	75
		2 ЭМ						241,95		1,19	7,59	9
		3 в т.ч. ОТм						104,49		0,51	20,83	11
		3Т		чел.-ч	91,15		0,448635					
		3Тм		чел.-ч	7,74		0,037926					
		Итого по расценке						979,35		4,80		
		ФОТ								4,12		86
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1		%	103		103			4,24		89

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	51
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Минстроя сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1		%	59		59			2,43			
Всего по позиции													224
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :													11,47
Итого прямые затраты (справочно)													9 991,06
В том числе:													6 794,98
Оплата труда рабочих													3 196,08
Эксплуатация машин													302,34
Оплата труда машинистов													20 854,32
Строительные работы													6 794,98
В том числе:													3 196,08
оплата труда													7 044,71
эксплуатация машин и механизмов													3 818,55
накладные расходы													7 097,32
сметная прибыль													7 044,71
Итого ФОТ (справочно)													3 818,55
Итого накладные расходы (справочно)													20 854,32
Итого сметная прибыль (справочно)													
Итого по разделу 1 Демонтажные работы													
Раздел 2. Монтажные работы по кровле													
Устройство основной кровли													
9	9	ФЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом для разуклонки к воронкам	м3			11,2						
Приказ от 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25													
421/пр п.585													
1 ОТ													5 672
2 ЗМ													3 206
3 в т.ч. ОТм													1 117
ЗТ													
ЗТм													
Итого по расценке													
ФОТ													694,66
Приказ НР Кровли													325,90
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020													319,71
Прил. п.12													
Приказ СП Кровли													157,90
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020													3 289
Прил. п.12													
Всего по позиции													18 827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	ФССЦ-02.2.01.03-0001	Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм	м3			11,54	163,00		1 881,02	6,17	11 606
11	11	ФЕР12-01-017-01	(Кровли) Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 55 мм) Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			8,5981					
		1 ОТ						209,95	1,15	2 075,95	20,83	43 242
		2 ЗМ						189,93	1,25	2 041,30	7,59	15 493
		3 в т.ч. ОТм						21,86	1,25	234,94	20,83	4 894
		4 М						36,67		315,29	6,17	1 945
		ЗТ		чел.-ч	24,3	1,15	240,273904					
		ЗТм		чел.-ч	1,94	1,25	20,8503925					
		Итого по расценке					436,55					
		ФОТ								4 432,54		48 136
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020		%	109	0,9	98,1			2 310,89		47 221
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020		%	57	0,85	48,45			1 119,63		23 322
12	12	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Всего по позиции Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			13,16	548,30		7 819,15	6,17	131 223
13	13	ФЕР12-01-017-02	(Кровли) Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ПЗ=40 (ОЗП=40; ЗМ=40 к расх.; ЗПМ=40; МАТ=40 к расх.; ТЗ=40; ТЗМ=40) Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	100 м2			8,5981					
		1 ОТ						8,64	46	3 417,23	20,83	71 181
		2 ЗМ						2,66	50	1 143,55	7,59	8 680
		3 в т.ч. ОТм						0,34	50	146,17	20,83	3 045
		ЗТ		чел.-ч	1	46	395,5126					
		ЗТм		чел.-ч	0,03	50	12,89715					
		Итого по расценке					11,30			4 560,78		74 226
		ФОТ								3 563,40		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			3 495,70		72 816
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 726,47		35 962
14	14	ФССЦ- 04.3.01.09- 0001	Всего по позиции Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3			35,08	424,88		9 782,95	6,17	188 639
15	15	ФЕР26-01-048- 04	(Кровли) Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (армирование стяжки)	100 м2			8,5981			14 904,79		91 963
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ		чел.-ч	11	1,15	108,765965	93,83	1,15	927,77	20,83	19 325
		2 ЭМ						36,80	1,25	395,51	7,59	3 002
		3 в т.ч. ОТМ						6,50	1,25	69,86	20,83	1 455
		4 М						32,19		276,77	6,17	1 708
		3Т										
		3Тм		чел.-ч	0,56	1,25	6,01867	162,82		1 600,05		
		Итого по расценке								987,63		20 780
		ФОР								870,93		18 141
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			466,39		9 715
16	16	ФССЦ- 08.1.02.17- 0089	Всего по позиции Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм (Материалы для строительных работ)	м2			902,8005	33,74		2 937,37	6,17	51 891
										30 460,49		187 941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	ФЕР12-01-016-02	Осрунтровка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			8,5981					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
			1 ОТ					24,47	1,15	241,95	20,83	5 040
			2 ЗМ					2,63	1,25	28,27	7,59	215
			3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	4,94	20,83	103
			4 М					90,00		0,00	6,17	
			ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	27,685882					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,429905					
			Итого по расценке				27,10					
			ФОТ							270,22		5 143
			Приказ НР Кроали	%	109	0,9	98,1			246,89		5 045
			Минстроя							242,20		
			России №									
			812/лр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.12									
			Приказ СП Кроали	%	57	0,85	48,45			119,62		2 492
			Минстроя									
			России №									
			774/лр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.12									
18	18	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Всего по позиции Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т			0,301	11 885,47		632,04	6,17	12 792
19	19	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2			8,5981					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
			1 ОТ					134,98	1,15	1 334,66	20,83	27 801
			2 ЗМ					24,64	1,25	264,82	7,59	2 010
			3 в т.ч. ОТм					3,75	1,25	40,30	20,83	839
			4 М					182,33		1 567,69	6,17	9 673
			ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15	141,989023					
			ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	3,1168113					
			Итого по расценке				341,95			3 167,17		28 640
			ФОТ							1 374,96		28 096
			Приказ НР Кроали	%	109	0,9	98,1			1 348,84		
			Минстроя									
			России №									
			812/лр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.12									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			666,17		13
20	20	ФССЦ- 12.1.02.03- 0051	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, основа полиизостер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 500 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2			980,1834	53,31		52 253,58	6,17	81 456 322 405
			(Кровли)							5 182,18		
21	21	ФССЦ- 12.1.02.03- 0055	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭЛП, основа полиизостер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2			997,3796	38,42		38 319,32	6,17	236 430
			(Кровли)									
Примыкания к вентштахтам, парапетам и выходу на кровлю												
22	22	ФЕР12-01-016- 02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			0,8575					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ				24,47	1,15		24,13	20,83	503
			2 ЭМ				2,63	1,25		2,82	7,59	21
			3 в т.ч. ОТМ				0,46	1,25		0,49	20,83	10
			4 М				90,00			0,00	6,17	
			ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	2,76115					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,042875					
			Итого по расценке				27,10			26,95		
			ФОТ							24,62		513
			Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109	0,9	98,1			24,15		503
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57	0,85	48,45			11,93		249
			Всего по позиции							63,03		1 276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т			0,03	11 885,47		356,56	6,17	2 200
24	24	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м			2,45					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
		1 ОТ						325,89	1,15	918,20	20,83	19 126
		2 ЭМ						74,10	1,25	226,93	7,59	1 722
		3 В.Т.Ч. ОТм						11,33	1,25	34,70	20,83	723
		4 М						462,96		1 134,25	6,17	6 998
		ЗТ			35,5	1,15	100,02125					
		ЗТм			0,86	1,25	2,63375					
		Итого по расценке						862,95		2 279,38		
		ФОТ								952,90		19 849
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12			109	0,9	98,1			934,79		19 472
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12			57	0,85	48,45			461,68		9 617
25	25	ФССЦ-12.1.02.03-0051	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше-15 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2			308,7	53,31		16 456,80	6,17	101 538
Всего по позиции												
								3 675,85				56 935
26	26	ФССЦ-12.1.02.03-0055	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше-15 °С, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2			308,7	38,42		11 860,25	6,17	73 178
(Кровли)												
27	27	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (фартуки к парапету) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	100 м2			0,147					
(Кровли)												

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
		1 ОТ						829,12	1,15	140,16	20,83	2 920
		2 ЭМ						21,88	1,25	4,02	7,59	31
		3 в т.ч. ОТм						3,51	1,25	0,64	20,83	13
		4 М						6 516,18		957,88	6,17	5 910
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,15	16,43166					
		ЗТм		чел.-ч	0,27	1,25	0,0496125					
		Итого по расценке					7 367,18			1 102,06		
		ФОТ								140,80		2 933
		Приказ НР Кровли								138,12		2 877
		Минстроя		%	109	0,9	98,1					
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.12										
		Приказ СП Кровли								68,22		1 421
		Минстроя		%	57	0,85	48,45					
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.12										
Всего по позиции											1 308,40	13 159
Параграфы												
28	28	ФЕР26-01-048- Устройство на плоских и криволинейных		100 м2			0,4576					
	04	поверхностях каркаса изоляции: из сетки										
(армирование стяжки)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
		1 ОТ						93,83	1,15	49,38	20,83	1 029
		2 ЭМ						36,80	1,25	21,05	7,59	160
		3 в т.ч. ОТм						6,50	1,25	3,72	20,83	77
		4 М						32,19		14,73	6,17	91
		ЗТ		чел.-ч	11	1,15	5,78964					
		ЗТм		чел.-ч	0,56	1,25	0,32032					
		Итого по расценке					162,82			85,16		
		ФОТ								53,10		1 105
		Приказ НР Теплоизоляционные работы								46,36		966
		Минстроя		%	97	0,9	87,3					
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.20										
		Приказ СП Теплоизоляционные работы								24,82		517
		Минстроя		%	55	0,85	46,75					
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.20										
Всего по позиции											156,34	2 763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм (Материалы для строительных работ)	м2			48,048	33,74		1 621,14	6,17	10 002
30	30	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 40 мм)	100 м2			0,4576					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					209,95	1,15	110,48	20,83	2 301
			2 ЗМ					189,93	1,25	108,64	7,59	825
			3 в т.ч. ОТМ					21,86	1,25	12,50	20,83	260
			4 М					36,67		16,78	6,17	104
			ЗТ		24,3	1,15	12,787632					
			ЗТм		1,94	1,25	1,10968					
			Итого по расценке				436,55			235,90		2 561
			ФОТ							122,98		2 512
			Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020		109	0,9	98,1			120,64		
			Прил. п.12									
			Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020		57	0,85	48,45			59,58		1 241
			Прил. п.12									
31	31	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Всего по позиции Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			0,700128	548,30		416,12	6,17	6 983
			(Кровли)							383,88		2 369
32	32	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2			0,4576					
			ПЗ=25 (ОЗП=25; ЗМ=25 к расх.; ЗПМ=25; ТЗМ=25)									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					8,64	28,75	113,67	20,83	2 368
			2 ЗМ					2,66	31,25	38,04	7,59	289
			3 в т.ч. ОТМ					0,34	31,25	4,86	20,83	101
			ЗТ		1	28,75	13,156					
			ЗТм		0,03	31,25	0,429					
			Итого по расценке				11,30			151,71		2 469
			ФОТ							118,53		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			116,28		2 422
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			57,43		1 196
33	33	ФССЦ- 04.3.01.09- 0015	Всего по позиции Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3			1,16688	548,30		325,42	6,17	6 275 3 948
34	34	ФЕР12-01-016- 02	(Кровли) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			0,4576					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 х расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						24,47	1,15	12,88	20,83	268
		2 ЭМ						2,63	1,25	1,50	7,59	11
		3 в т.ч. ОТм						0,46	1,25	0,26	20,83	5
		4 М						90,00		0,00	6,17	
		ЗТ		чел.-ч	2,8	1,15	1,473472					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,02288					
		Итого по расценке						27,10		14,38		
		ФОТ								13,14		273
		Приказ НР Кровли Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			12,89		268
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			6,37		132
35	35	ФССЦ- 01.2.03.05- 0010	Всего по позиции Праймер битумный производства «Техно- Николь»	т			0,01602	11 885,47		33,64	6,17	679 1 175
36	36	ФЕР12-01-002- 09	(Кровли) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2			0,4576					

ГРАНД-Смета 2021.1.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			732,66		15 261
		Приказ СП Кровли Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			361,85		7 537
40	40	счет фактура № 617 от 03.06.2021	Костыли кровельные стальные размер Т - образные 4x100x450 мм	шт			320	30,03		6 836,86	6,17	69 158
			(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=218/1,2/6,17*1,02									
41	41	ФССЦ- 01.7.15.07- 0083	Дюбель-гвоздь 8x80 мм	100 шт			6,4	118,00		755,20	6,17	4 680
42	42	ФЕР15-02-001- 01	Улучшенная штукатурка стен парпетов (над примыканиями) цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2			0,544					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						587,78	1,15	367,72	20,83	7 660
		2 ЭМ						45,09	1,25	30,66	7,59	233
		3 в т.ч. ОТм						21,38	1,25	14,54	20,83	303
		4 М						979,70		532,96	6,17	3 288
		3Т		чел.-ч	61,1	1,15	38,22416					
		3Тм		чел.-ч	2,4	1,25	1,632					
		Итого по расценке						1 612,57				
		ФОТ								931,34		7 963
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			382,26		7 167
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			159,21		3 317
			Всего по позиции									
										1 434,58		21 665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен parapeta	100 м2			0,544					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
			1 ОТ					120,21	1,15	75,20	20,83	1 566
			2 ЗМ					4,06	1,25	2,76	7,59	21
			3 в т.ч. ОТМ					0,70	1,25	0,48	20,83	10
			4 М					0,02		0,01	6,17	
			ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	8,095264					
			ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,25	0,0408					
			Итого по расценке					124,29		77,97		
			ФОТ							75,68		1 576
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			68,11		1 418
			Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020									
			Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			31,52		656
			Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020									
			Прил. п.15									
44	44	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Всего по позиции Грунтовка акриловая, антисептическая, грубого проникновения	кг			7,072	15,25		177,60	6,17	3 661
			(Отделочные работы)							107,85		665
45	45	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101	т			0,020672	10 810,00		223,46	6,17	1 379
(Отделочные работы)												
46	46	ФЕР08-08-005-01	Вентшахты и дефлекторы Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтиков	м3			6,65					
Приказ от 04.08.2020 № возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586												
			1 ОТ					104,01	1,15	795,42	20,83	16 569
			2 ЗМ					46,30	1,25	384,87	7,59	2 921
			3 в т.ч. ОТМ					5,77	1,25	47,96	20,83	999
			4 М					134,83		475,41	6,17	2 933
			ЗТ	чел.-ч	11,9	1,15	91,00525					
			ЗТМ	чел.-ч	0,44	1,25	3,6575					
			Итого по расценке					221,80		1 655,70		17 568
			ФОТ							843,38		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			834,95		17 392
		Прил. п.8										
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			494,64		10 304
		Прил. п.8										
47	47	ФССЦ-06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт			3,259	2 088,24		2 985,29		50 119
			(Материалы)							6 805,57	6,17	41 990
48	48	счет фактура № 617 от 03.06.2021	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, размером 1550х400 мм прим 1620х400 мм	шт			8	1 667,76		13 342,08	6,17	82 321
			(Материалы)									
			Цена=12106/6,17/1,2*1,02									
49	49	счет фактура № 617 от 03.06.2021	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, размером 3630х400 мм прим 3720х400 мм	шт			2	3 307,70		6 615,40	6,17	40 817
			(Материалы)									
			Цена=24010/6,17/1,2*1,02									
50	50	счет фактура № 617 от 03.06.2021	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, размером 1760х400 мм прим 1860х400 мм	шт			6	1 777,15		10 662,90	6,17	65 790
			(Материалы)									
			Цена=12900/6,17/1,2*1,02									
51	51	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2			0,73					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						393,32	1,15	330,19	20,83	6 878
		2 ЭМ						1,51	1,25	1,38	7,59	10
		3 в т.ч. ОТм						0,59	1,25	0,54	20,83	11
		4 М						3 289,46		2 401,31	6,17	14 816
		ЗТ		чел.-ч	46,11	1,15	38,709345					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,0365					
		Итого по расценке					3 684,29			2 732,88		6 889
		ФОТ								330,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			297,66		6 200
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			137,75		2 859
52	52	ФЕР10-01-044- 12	Обивка вент шахт профнастилом С8-1150- 0,5	100 м2			0,73			3 168,29		30 773
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1 ОТ						651,88	1,15	547,25	20,83	11 399
		2 ЭМ						15,31	1,25	13,97	7,59	106
		3 в т.ч. ОТм						2,23	1,25	2,03	20,83	42
		4 М						8 074,17		7,42	6,17	46
		ЗТ		чел.-ч	79,79	1,15	66,983705					
		ЗТм		чел.-ч	0,18	1,25	0,16425					
		Итого по расценке					677,36					
		ФОТ								588,64		11 441
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			549,28		11 121
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			256,79		5 349
53	53	счет фактура № 617 от 03.06.2021	Профилированный лист С8А цинк 0,5 Optima 1.0	м2			80,3	109,25		1 359,33	6,17	28 021
			(Материалы) Цена=793/6,17/1,2*1,02							8 772,78		54 128
54	54	ФССЦ- 08.1.02.03- 0109	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: внутренний размером 100х100 мм прим без покрытия (Материалы)	м			57,6	15,99		921,02	6,17	5 683
55	55	ФЕР20-02-012- 03	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 450 мм прим	шт			3					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586										
		1 ОТ						37,96	1,15	130,96	20,83	2 728
		2 ЭМ						5,27	1,25	19,76	7,59	150
		3 в т.ч. ОТМ						0,26	1,25	0,98	20,83	20
		4 М						7,63		22,89	6,17	141
		ЗТ		чел.-ч	4,45	1,15	15,3525					
		ЗТМ		чел.-ч	0,02	1,25	0,075					
		Итого по расценке										
		ФОТ						50,86		173,61		2 748
		Приказ НР Сантехнические работы - внутреннее										
		Минстрой (трубопроводы, водопровод, канализация,		%	121	0,9	108,9			131,94		2 993
		России № отопление, газоснабжение, вентиляция и								143,66		
		812/лр от кондиционирование воздуха)										
		21.12.2020										
		Прил. п.16										
		Приказ СП Сантехнические работы - внутреннее										
		Минстрой (трубопроводы, водопровод, канализация,		%	72	0,85	61,2			80,75		1 682
		России № отопление, газоснабжение, вентиляция и										
		774/лр от кондиционирование воздуха)										
		11.12.2020										
		Прил. п.16										
		Всего по позиции										
56	56	ФССЦ-								398,04		7 694
		19.1.04.02-	Дефлекторы статические из оцинкованной	шт			3	1 455,16		4 395,48	6,17	27 120
		0011	стали, диаметр 500 мм прим 450 мм									
		(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
		Ливневые воронки и люк										
57	57	ФЕР85-6-23	Смена: водосточных воронок	100 шт			0,03			133,71	20,83	2 785
		1 ОТ						4 457,00		1,80	7,59	12
		2 ЭМ						53,33		0,41	20,83	9
		3 в т.ч. ОТМ						13,81		6,53	6,17	40
		4 М						217,83				
		ЗТ		чел.-ч	491,4		14,742					
		ЗТМ		чел.-ч	1,1		0,033					
		Итого по расценке										
		ФОТ						4 728,16		141,84		2 794
		Приказ НР Внутренние санитарно-технические работы:										
		Минстрой смена труб, санприборов, запорной арматуры		%	103		103			134,12		2 878
		России № и другое (ремонтно-строительные)								136,14		
		812/лр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.99.2										
		Приказ СП Внутренние санитарно-технические										
		Минстрой работы: смена труб, санприборов, запорной		%	52		52			69,74		1 453
		России № арматуры и другое (ремонтно-строительные)										
		774/лр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.99.2										
		Всего по позиции										
										349,72		7 168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	счет фактура № 617 от 03.06.2021	Воронка Техноикопль с обжимным фланцем 110х450 мм и решеткой	шт			3	762,93		2 288,79	6,17	14 122
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) Цена=5538/1,2/6,17*1,02												
59	59	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			0,5328					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
		1 ОТ						19,03	1,15	11,66	20,83	243
		2 ЭМ						0,44	1,25	0,29	7,59	2
		3 в т.ч. ОТМ						0,16	1,25	0,11	20,83	2
		4 М						2 225,45		1 185,72	6,17	7 316
		ЗТ		чел.-ч	1,95	1,15	1,194804					
		ЗТМ		чел.-ч	0,01	1,25	0,00666					
		Итого по расценке						2 244,92		1 197,67		
		ФОТ								11,77		245
		Приказ НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7			9,85		205
		Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9										
		Приказ СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			6,20		129
		Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9										
Всего по позиции											1 213,72	7 895
Допрабы												
60	60	ФЕР20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	шт			3					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/лр п.586												
		1 ОТ						3,30	1,15	11,39	20,83	237
		2 ЭМ						1,35	1,25	5,06	7,59	38
		3 в т.ч. ОТМ						0,12	1,25	0,45	20,83	9
		4 М						2,04		6,12	6,17	38
		ЗТ		чел.-ч	0,36	1,15	1,242					
		ЗТМ		чел.-ч	0,01	1,25	0,0375					
		Итого по расценке						6,69		22,57		245
		ФОТ								11,84		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16 Приказ СП Сантехнические работы - внутренние Минстроя (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16	%	121	0,9	108,9			12,89		268
				%	72	0,85	61,2			7,25		151
61	61	ФССЦ- 19.2.02.01- 0001	Всего по позиции Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 200 мм прим оцинкованные	шт			3	138,79		42,71	6,17	732
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									2 569
			Итого по разделу 2 Монтажные работы по кровле :									
			Итого прямые затраты (справочно)							281 892,17		
			В том числе:									
			Оплата труда рабочих							12 856,70		
			Эксплуатация машин							5 194,59		
			Оплата труда машинистов							680,07		
			Материалы							263 840,88		
			Строительные работы							301 604,79		
			В том числе:									
			оплата труда							12 856,70		
			эксплуатация машин и механизмов							5 194,59		
			материалы							263 840,88		
			накладные расходы							13 125,25		
			сметная прибыль							6 587,37		
			Итого ФОТ (справочно)							13 536,77		
			Итого накладные расходы (справочно)							13 125,25		
			Итого сметная прибыль (справочно)							6 587,37		
			Итого по разделу 2 Монтажные работы по кровле							301 604,79		
Раздел 3. Вывоз мусора												
62	62	ФССЦпг-01-01. 01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			85,1688	42,98		3 660,56	7,59	27 784
63	63	ФССЦпг-03-21. 01-035	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	1 т груза			85,1688	21,26		1 810,69	7,59	13 743
			Итого по разделу 3 Вывоз мусора :									
			Итого прямые затраты (справочно)							5 471,25		
			В том числе:									
			Эксплуатация машин							5 471,25		
			Строительные работы							5 471,25		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							5 471,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 3 Вывоз мусора												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
В том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов												
Материалы												
Строительные работы												
В том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
НДС 20% (только ТЦ)												
ВСЕГО по акту												



Сдал: Генеральный директор ООО "СтройПодряд"

Принял: ИП генерального директора
НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Старший по дому (

Д.А. Касьянов

Д.С. Бодров

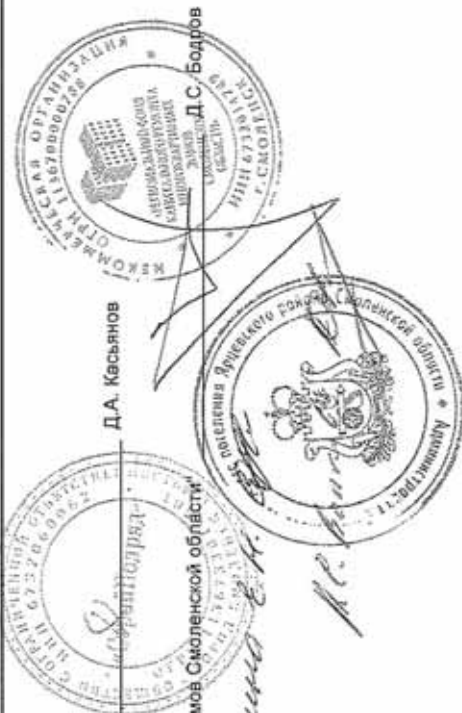

Расценки	
соответствуют	
смете	О.М. Дмитриева
