

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	032205
Подрядчик (Субподрядчик)	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Починковский район, дер. Климщина, д. 89		
	_____ (наименование, адрес)		
	_____ (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	№37/ЭА23а-2021
		дата	12.03.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	25.06.2021	с 29.03.2021 по 25.06.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС 02-01-01, капитальный ремонт крыши
 Основание: ведомость объемов
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1411,16 (139,5) тыс.руб.
 Средства на оплату труда: 102,96 (12,21) тыс.руб.
 Сметная трудоемкость: 1378,94 чел.час.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	1	ФЕР46-04-008. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	2,6186								
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. 04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
		1 ОТ						124,02	1,25	405,95	8,43	3 422
		2 ЗМ						30,84	1,25	100,29	8,43	845
		999-9900 Строительный мусор	м	5,708548								
		ЗТ	чел.-ч	52,044675								
		Итого по расценке		154,66						506,24		3 422
		ФОТ								405,95		3 388
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих	%	99	110	0,9				401,89		
		Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих	%	59,5	70	0,85				241,54		2 036
		18.11.04 конструкций, возведение отдельных конструкций элементов										
		Прил.1 п.49 конструкций элементов										
2	2	Всего по позиции	100 м2	2,6186						1 149,67		9 691
		Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами										
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных. 04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил.10 табл.3 п.10.2												
		1 ОТ						120,37	1,25	394,00	8,43	3 321
		2 ЗМ						39,74	1,25	130,08	8,43	1 097
		3 в т.ч. ОТм						6,21	1,25	20,33	8,43	171
		999-9900 Строительный мусор	м	3,66604								
		ЗТ	чел.-ч	49,62247								
		ЗТм	чел.-ч	1,505695								
		Итого по расценке		160,11						524,08		3 492
		ФОТ								414,33		2 898
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83	83					343,89		
		33.2004										
		Прил.5 п.8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65	65					269,31		2 270
		5536/06										
		Прил.2 п.8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ФЕРр58-1-3	Всего по позиции	100 м2						1 137,28		9 586
			Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен				2,6186					
Приказ от 04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 и расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.2												
		1 ОТ		м	1,25		3,27325	219,08	1,25	717,10	8,43	6 045
		2 ЭМ		чел.-ч	27,08	1,25	88,63961	36,29	1,25	118,79	8,43	1 001
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	0,42	1,25	1,374765	5,67	1,25	18,56	8,43	156
		999-9900 Строительный мусор										
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						255,37		835,89		
		ФОТ								735,66		6 201
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83		83			610,60		5 147
		33.2004										
		Прил. 5 п. 8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65		65			478,18		4 031
		5536/06										
		Прил. 2 п. 8										
4	4	ФЕРр58-1-4	Всего по позиции	100 м2			2,6186			1 924,67		16 224
			Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов									
		1 ОТ						53,44		139,94	8,43	1 180
		2 ЭМ						23,33		61,09	8,43	515
		3 в т.ч. ОТМ						3,65		9,56	8,43	81
		999-9900 Строительный мусор		м	0,81		2,121066					
		ЗТ		чел.-ч	6,73		17,623178					
		ЗТМ		чел.-ч	0,27		0,707022					
		Итого по расценке						76,77		201,03		1 261
		ФОТ								149,50		1 047
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	83		83			124,09		
		33.2004										
		Прил. 5 п. 8										
		Письмо №АП- СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	65		65			97,18		820
		5536/06										
		Прил. 2 п. 8										
5	5	ФЕРр58-2-2	Всего по позиции	100 шт			0,02			422,30		3 562
			Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных									
		1 ОТ						2 455,84		49,12	8,43	414
		2 ЭМ						10,37		0,21	8,43	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
999-9900	Строительный мусор			м	5,6		0,112					
ЗТ				чел.-ч	309,3		6,186					
Итого по расценке												
	ФОТ							2 466,21		49,33		
МДС81-	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	83		83			49,12		414
33.2004										40,77		344
Прил.5 п.8												
Письмо №АП-	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	65		65			31,93		269
5536/06												
Прил.2 п.8												
Всего по позиции												
8	6	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3			7,2738			122,03		1 029
01												
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных.												
04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.596												
1	ОТ							197,78	1,4375	2 068,00	8,43	17 433
2	ЭМ							31,77	1,5625	361,08	8,43	3 044
3	в т.ч. ОТМ							4,58	1,5625	52,05	8,43	439
4	М							2 068,16		15 043,38	8,43	126 816
ЗТ												
	Чел.-ч		23,8			1,4375	248,854882					
5												
ЗТМ												
	Чел.-ч		0,37			1,5625	4,2051656					
Итого по расценке												
	ФОТ							2 297,71		17 472,46		17 872
МДС81-	НР Деревянные конструкции			%	118	0,9	106,2			2 120,05		18 980
33.2004										2 251,49		
Прил.4 п.10												
Письмо №АП-	СП Деревянные конструкции			%	63	0,85	53,55			1 135,29		9 570
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.10												
Всего по позиции												
9	7	ФЕР26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			8,19			20 859,24		175 843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЭМ												
14.2.02.11 Составы огнезащитные												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОР												
МДС81-НР Теплоизоляционные работы												
33.2004												
Прил.4 п.20												
Письмо №АП-СП Теплоизоляционные работы												
5536/06 от												
18.11.04												
Прил.1 п.20												
Всего по позиции												
9.1	8	ФССЛ-14.2.06.01-0003	Антисептик-ангипирен «ПИРИЛАКС-ТЕРМА» для древесины	кг			151,515	15,16		2 296,97	8,43	3 514 19 363
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Объем=0,151515*1000												
10	9	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			2,6186					
Приказ от Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных.												
04.08.2020 № ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр прил.10												
табл.3 п.10.2												
п.1.12 ОП Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом ОЗП=1%; ТЗ=1%												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
08.1.02.07 Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.												
12.1.03.02 Металлочерепица												
ЗТ												
ЗТМ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					13 139,40				
			ФОТ							37 232,57		
			МДС81- НР Кровли	%	120	0,9	108			6 379,14		53 776
			33.2004							6 889,47		58 078
			Прил.4 п.12									
			Письмо №АП- СП Кровли	%	65	0,85	55,25			3 524,47		29 711
			5536/08 от									
			18.11.04									
			Прил.1 п.12									
Всего по позиции												
10.1	10	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2			329,9436	70,50		47 646,51	8,43	401 660
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
10.2	11	ФССЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м			87	25,00		2 175,00	8,43	18 335
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
10.3	12	ТЦ_12.1.01.05_67_67182209_60_10.03.2021_02	Снегодержатель плоско-овальный BORGE для кровли, шт-3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета	шт			20	2 466,67	1,02	5 969,16	8,43	50 320
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Цена=2960/1,2												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а												
10.4	13	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2			53,06	164,28		8 716,70	8,43	73 482
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
10.5	14	ФССЦ-08.3.06.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2			17,17	45,82		786,73	8,43	6 632
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
11	15	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт			1					
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Приказ от 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421/пр п.585												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
								51,86	1,15	59,64	8,43	503
								19,92	1,25	24,90	8,43	210
								2,77	1,25	3,46	8,43	29
								224,49		224,49	8,43	1 892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.04.08	Скобяные изделия	компл	0							
		11.2.07.11	Стеорки оконные	м2	0							
		ЗТ		чел.-ч	6,08	1,15	6,992					
		ЗТм		чел.-ч	0,22	1,25	0,275					
		Итого по расценке						296,27				
		ФОТ								309,03		532
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2			63,10		565
		33.2004								67,01		
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,85	53,55			33,79		285
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										
Всего по позиции												
11.1	16	ТЦ_07.1.02.00	Жалюзийная решетка с ПВХ рамой СВ-АП	шт		1		11 275,00	1,02	409,83	8,43	3 455
		_67_62330236								1 364,29		11 501
		7296_10.03.20										
		21_02										
		(Деревянные конструкции)										
		Цена=13530/1,2										
		Показ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)										
		04.08.2020 №										
		421/пр п.92а										
12	17	ФЕР10-01-053-	Установка каркаса из брусьев для навесов	м3		0,0314						
	01	и крылец (лестница к слух окнам)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к										
		04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						380,64	1,15	13,74	8,43	116
		2 ЭМ						29,96	1,25	1,18	8,43	10
		3 в т.ч. ОТм						4,33	1,25	0,17	8,43	1
		4 М						2 404,80		75,51	8,43	637
		ЗТ		чел.-ч	39	1,15	1,40829					
		ЗТм		чел.-ч	0,35	1,25	0,0137375					
		Итого по расценке						2 815,40		90,43		117
		ФОТ								13,91		124
		МДС81- НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2			14,77		
		33.2004										
		Прил.4 п.10										
		Письмо №АП- СП Деревянные конструкции		%	63	0,85	53,55			7,45		63
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции											112,65	950
13	18	ФЕР10-01-044-12	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом	100 м2			0,05					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/нр п.586												
			1 ОТ					651,88	1,15	37,48	8,43	316
			2 ЭМ					15,31	1,25	0,96	8,43	8
			3 в т.ч. ОТм					2,23	1,25	0,14	8,43	1
			4 М					8 074,17		403,71	8,43	3 403
			ЗТ		79,79	1,15	4,587925					
			ЗТм		0,18	1,25	0,01125					
			Итого по расценке					8 741,36		442,15		
			ФОТ							37,62		317
			МДС81-НР Деревянные конструкции 33.2004	%	118	0,9	106,2			39,95		337
			Прил.4 п.10									
			Письмо №АП-СП Деревянные конструкции 5536/06 от 18.11.04	%	63	0,85	53,55			20,15		170
			Прил.1 п.10									
Всего по позиции											502,25	4 234
13.1	19	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-0,036	11 200,00		-403,20	8,43	-3 399
(Деревянные конструкции)												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/нр п.586												
13.2	20	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2			5,5	57,10		314,05	8,43	2 647
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
16	21	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов с кобылками и подшивкой свесов	100 м2			0,38					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/нр п.586												
			1 ОТ					1 219,79	1,15	533,05	8,43	4 494
			2 ЭМ					59,14	1,25	28,09	8,43	237
			3 в т.ч. ОТм					10,44	1,25	4,96	8,43	42
			4 М					4 013,93		1 525,29	8,43	12 858
			ЗТ		143	1,15	62,491					
			ЗТм		0,9	1,25	0,4275					
			Итого по расценке					5 292,86		2 086,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
			МДС81- НР Прочие ремонтно-строительные работы 33.2004 Прил.5 п.19	%	78		78			2,16			
			Письмо №АП- СП Прочие ремонтно-строительные работы 5536/06 Прил.2 п.19	%	50		50			1,39			12
Всего по позиции													589
19	25	ФЕР46-04-001- Разборка: кирпичных стен (вентшахт)	м3				4,7			69,74			
	04												
		1 ОТ						62,91		295,68	8,43		2 493
		2 ЭМ						59,65		280,36	8,43		2 363
		3Т					33,37						
		Итого по расценке			7,1			122,56		576,04			
		ФОТ								295,68			2 493
		МДС81- НР Работы по реконструкции зданий и 33.2004 сооружений: усиление и замена существующих Прил.4 п.49 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		110	0,9	99			292,72			2 468
		Письмо №АП- СП Работы по реконструкции зданий и 5536/06 от сооружений: усиление и замена существующих 18.11.04 конструкций, возведение отдельных Прил.1 п.49 конструктивных элементов	%		70	0,85	59,5			175,93			1 483
Всего по позиции													8 807
20	26	ФЕР08-08-005- Кладка дымовых кирпичных труб	м3				4,72			1 044,69			
	01												
		1 ОТ						104,01	1,15	564,57	8,43		4 759
		2 ЭМ						46,30	1,25	273,17	8,43		2 303
		3 в т.ч. ОТм						5,77	1,25	34,04	8,43		287
		4 М						134,83		636,40	8,43		5 365
		06.1.01.05 Кирпич керамический	1000 шт		0,49		2,3128						
		3Т	чел.-ч		11,9	1,15	64,5932						
		3Тм	чел.-ч		0,44	1,25	2,596						
		Итого по расценке						285,14		1 474,14			
		ФОТ								598,61			5 046
		МДС81- НР Конструкции из кирпича и блоков 33.2004 Прил.4 п.8	%		122	0,9	109,8			657,27			5 541
		Письмо №АП- СП Конструкции из кирпича и блоков 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.8	%		80	0,85	68			407,05			3 431
Всего по позиции													21 399
Всего по позиции											2 538,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	ФССЦ-08.3.05.02-0031	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм	т			-0,02832	7 450,00		-210,98	8,43	-1 779
		Удален из поз. 20	(Конструкции из кирпича и блоков) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
28	28	ФССЦ-08.3.07.01-0001	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т			-0,01888	4 660,00		-87,98	8,43	-742
		Удален из поз. 20	(Конструкции из кирпича и блоков) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
20.1	29	ФССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3			-0,1888	485,90		-91,74	8,43	-773
			(Конструкции из кирпича и блоков) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
20.2	30	ФССЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3			0,1888	559,23		105,58	8,43	890
20.3	31	ФССЦ-06.1.01.05-0039	(Стены (ремонтно-строительные)) Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт			2,3128	2 088,24		4 829,68	8,43	40 714
20.4	32	ТЦ 19.2.02.04_67_67321312_03_10.03.2021_02	(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Зонт вентиляционный с покрытием "Полиэстр" в цвет кровли (размер 740х740)	шт			2	5 166,67	1,02	1 250,30	8,43	10 540
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=6200/1,2 Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 04.08.2020 № 421/пр п.92а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.5	33	ТЦ 19.2.02.04	Зонт вентиляционный с покрытием	шт			4	5 083,33	1,02	2 460,26	8,43	20 740
		67_67321312	"Полиэстр" в цвет кровли (размер 610x740)									
		03_10.03.2021										
		_02										
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Цена=6100/1,2												
Приказ от Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%												
04.08.2020 №												
421/пр п.92а												
21	34	ФЕР15-02-041-	Устройство металлического каркаса из	100 м2			0,194					
	03		направляющих профилей под облицовку									
различными материалами: стен												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						393,32	1,15	87,75	8,43	740
		2 ЗМ						1,51	1,25	0,37	8,43	3
		3 в т.ч. ОТм						0,59	1,25	0,14	8,43	1
		4 М						3 269,46		638,16	8,43	5 380
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке						3 684,29		726,28		
		ФОТ								87,89		741
		МДС81-	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			83,06		700
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			41,09		346
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										
Всего по позиции										850,43		7 169
22	35	ФЕР12-01-033-	прим.Облицовка вентилят стальной	100 м2			0,194					
	01		профилированным листом									
п.1.12 ОП Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом ОЗП=1%, ТЗ=1%												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к												
04.08.2020 № расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
		1 ОТ						283,18	1,1615	63,81	8,43	538
		2 ЗМ						28,03	1,25	6,80	8,43	57
		3 в т.ч. ОТм						4,04	1,25	0,98	8,43	8
		4 М						57,28		11,11	8,43	94
08.10.2020 № расх.: Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м	0							
		ЗТ		чел.-ч	32,4	1,1615	7,3007244					
		ЗТМ		чел.-ч	0,32	1,25	0,0776					
		Итого по расценке			368,49					81,72		
		ФОТ								64,79		546
		МДС81-НР Кровли		%	120	0,9	108			69,97		590
		33.2004										
		Прил.4 п.12										
		Письмо №АП-СП Кровли		%	65	0,85	55,25			35,80		302
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.12										
22.1	36	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2		21,34	57,10			1 218,51	8,43	10 272
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							187,49		1 581
22.2	37	ФССЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием 100x100 (прим)	м		31	7,60			232,50	8,43	1 960
			(Перевозка грузов автотранспортом)									
23	38	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2		0,2307						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
		1 ОТ						33,87	1,15	8,99	8,43	76
		2 ЭМ						22,14	1,25	6,38	8,43	54
		3 в т.ч. ОТм						0,58	1,25	0,17	8,43	1
		4 М						1,84		0,42	8,43	4
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе		кг	13,8	1,15	3,18366					
		ЗТ		чел.-ч	3,69		0,9789755					
		ЗТМ		чел.-ч	0,05	1,25	0,0144188					
		Итого по расценке						57,85		15,79		77
		ФОТ								9,16		73
		МДС81-НР Отделочные работы		%	105	0,9	94,5			8,66		
		33.2004										
		Прил.4 п.15										
		Письмо №АП-СП Отделочные работы		%	55	0,85	46,75			4,28		36
		5536/06 от										
		18.11.04										
		Прил.1 п.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
23.1	39	ФССЦ-14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т			0,008075	18 390,16		28,73		243
			(Отделочные работы)							148,50	8,43	1 252
24	40	ФЕР16-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2			0,2307					
			Приказ от 04.08.2020 № расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/нр п.586									
			1 ОТ					589,55	1,15	156,41	8,43	1 319
			2 ЭМ					85,89	1,25	24,77	8,43	209
			3 в т.ч. ОТМ					50,25	1,25	14,49	8,43	122
			4 М					865,26		199,62	8,43	1 683
			ЗТ	чел.-ч	65	1,15	17,244825					
			ЗТМ	чел.-ч	5,32	1,25	1,534155					
			Итого по расценке				1 540,70			380,80		
			ФОТ							170,90		1 441
			МДС81- НР Отделочные работы 33.2004	%	105	0,9	94,5			161,50		1 362
			Прил.4 п.15									
			Письмо №АП- СП Отделочные работы 5536/08 от 18.11.04	%	55	0,85	46,75			79,90		674
			Прил.1 п.15									
25	41	ФССЦнр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			21,9748	42,98		622,20	8,43	5 247
			Всего по позиции							944,48		7 962
26	42	ФССЦнр-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза			21,9748	11,42		250,95	8,43	2 116
			Итого по разделу 1 :									
			Итого прямые затраты (справочно)							119 413,42		
			В том числе:									
			Оплата труда рабочих:							12 213,83		
			Эксплуатация машин							5 155,23		
			Оплата труда машинистов							325,22		
			Материалы							102 044,36		
			Строительные работы							139 497,73		
			Строительные работы							138 302,30		
			В том числе:									
			оплата труда							12 213,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			эксплуатация машин и механизмов							3 959,80		
			материалы							102 044,36		
			накладные расходы							13 004,91		
			сметная прибыль							7 079,40		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 195,43		
			Итого ФОТ (справочно)							12 539,05		
			Итого накладные расходы (справочно)							13 004,91		
			Итого сметная прибыль (справочно)							7 079,40		
			Итого по разделу 1							139 497,73		
			В том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							11 044,01		
			Итого по акту:							119 413,42		1 006 655
			В том числе:									
			Оплата труда рабочих							12 213,83		102 964
			Эксплуатация машин							5 155,23		43 458
			Оплата труда машинистов							325,22		2 740
			Материалы							102 044,36		860 233
			Строительные работы							139 497,73		1 175 967
			В том числе:							138 302,30		1 165 889
			оплата труда							12 213,83		102 964
			эксплуатация машин и механизмов							3 959,80		33 380
			материалы							102 044,36		860 233
			накладные расходы							13 004,91		109 633
			сметная прибыль							7 079,40		59 679
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 195,43		10 078
			Итого ФОТ (справочно)							12 539,05		105 704
			Итого накладные расходы (справочно)							13 004,91		109 633
			Итого сметная прибыль (справочно)							7 079,40		59 679
			НДС 20% (только ТЦ)									235 193,40
			ВСЕГО по акту							139 497,73		1 411 160,40
			В том числе:									
			материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							11 044,01		93 101

Сдал: Директор ООО "Соберо"


О.П. Литвинчук

Принял И.п. Генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

Д.С. Бодров

Старшая по дому

Степаново домиково 9/1

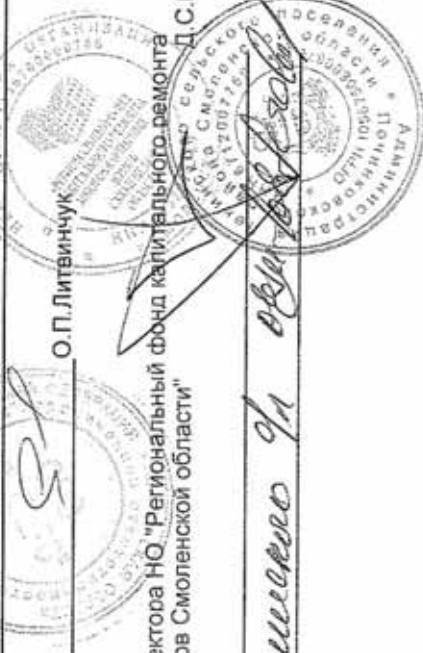

Расценки

соответствующим

сметам

О.В. Люченко
